

信暘綠電股份有限公司太陽能光電場

建置太陽能光電發電設施之地方說明會

會議紀錄

- 一、時間：中華民國 114 年 7 月 9 日(星期三)下午 3 時 30 分
- 二、地點：永樂村社區活動中心（地址：林邊鄉永樂村榮農路 8 號）
- 三、主持人：陳家亨 協理
- 四、報告人：陳家亨 協理 紀錄：黃律禎
- 五、出席單位及人員，請詳附件簽到表
- 六、主席及開發單位報告：

(一)信暘綠電股份有限公司規劃於屏東縣林邊鄉、佳冬鄉設置太陽光電發電設備，依據電業登記規則申請工作許可證，並採分期開發方式，就土地開發進度劃分許可之申請期別，本次地方說明會說明之設置廠址係為「信暘第一期(第三階段)太陽能光電場」等 1 案。

(二)專案簡介（請詳附件簡報資料）：

- 1. 案件基本資料：案件名稱、工作進度規劃、預定施作範圍（請詳附件土地清冊）
- 2. 施工期程、工程項目及施工方式、保障公共通行或具替代措施、緊急通報專線及聯絡人、升壓站設置說明(含開會地點與升壓站間之距離)、施工期間環保對策、運轉階段常見問題及太陽能模組回收方式進行說明。

七、意見討論交流：

(一)地主（黃先生）：

- 1. 針對租用作太陽光電的私人土地，周邊有些人會自行把農地圍過來占用，公司是否有做土地鑑界以確認範圍？

公司回應：

- 1. 配合法定程序，施工前皆須由地政事務所派員實地現勘進行鑑界，本公司會邀集地主及工程單位一同確立土地

邊界，施工期間亦會架設圍籬，避免發生私人占用周圍土地的情形，鄉親可以放心。

(二)地主（陳小姐）：

1. 倘已經確定出租土地完成地政鑑界，公司會在進場施工的時候再核對一次範圍嗎？這個環節地政處會參與嗎？施工前要再次確認土地邊界，確保鑑界範圍的界址或界樁沒有被別人移動過。

公司回應：

1. 後續設置案場圍籬時，本公司會再次測量土地界址，確認案場設置於承租範圍內，也確保土地未被臨地佔用；鑑界後倘鄰近居民對土地範圍有疑義，或審查單位有所要求，本公司也會再向地政事務所申請複丈。本公司會控管土地邊界並架設圍籬，以維護地主的土地完整性，保障地主權益。

八、散會：下午 4 時 30 分

信陽建置太陽能光電發電設施 地方說明會 議程表

項次	時間	說明
1	15:00-15:30	人員簽到、引導入座
2	15:30-15:40	嘉賓、長官介紹
3	15:40-16:00	整體計畫說明
4	16:00- 16:30	意見彙整說明及討論
5	16:30-16:40	結束議程，人員離場

1



信陽 建置太陽能光電發電設施 【地方說明會】

屏東縣-林邊鄉永樂村

日期：2025/7/9 (三) 15:30
地點：永樂村社區活動中心

◆ 案件期別
施工許可：信陽一期(第三階段)

信陽綠電股份有限公司

2

簡報大綱

- 01、案件基本資料
 - 案件名稱
 - 工作進度規劃
 - 預定施作範圍
- 02、施工期程
- 03、工程項目及施工方式
- 04、保障公共通行或具替代措施
- 05、緊急通報專線及聯絡人
- 06、升壓站設置說明
- 07、施工期間環保對策
- 08、運轉階段
- 09、回收階段
- 10、意見交流

01 籌設/工程計畫之基本資料

- 設置地點：屏東縣林邊鄉、佳冬鄉
- 併聯點：東港D/S變電所
- 電壓等級：161 kV
- 全案目標容量：56 MW
- 土地面積：28.33 公頃

* 依電業登記規則第3條規定，於各案件設置面積最大村里召開地方說明會

籌設許可					施工許可				
案件名稱	土地面積(公頃)	設置面積最大村里	籌設容量(MW)	申請進度	案件名稱	土地面積(公頃)	設置面積最大村里	施工容量(MW)	申請進度
信陽第一期	28.33	竹林村	31.63	已取得	第一期(第一階段)	11.12	竹林村	12.59	申請中
					第一期(第二階段)	9.33	竹林村	10.20	申請中
					第一期(第三階段)	1.31	永樂村	1.47	規劃中
					其他階段	規劃中			
合計	28.33	-	31.63	-	合計	21.77	-	24.26	-

註：施工許可容量以實際申請容量為準。

4

02 工作進度規劃


- PV模組型號：隆基 LR4-72HBD-450M
- 單一模組容量(W)：450 Wp
- 變流器型號：華為 SUN2000-40KTL-M3
華為 SUN2000-100KTL-M1
SUNLITE SL50K-C

案件名稱及基本資料				
期別	容量(MW)	類別		
信陽第一期	31.63	籌設許可	115.06	117.10
信陽第一期(第一階段)	12.59	施工許可	預計115.12前分批次完工併網	
信陽第一期(第二階段)	10.20	施工許可		
信陽第一期(第三階段)	1.47	施工許可	115.06取得施工許可	117.10完工併網

5

01 案件基本資料


籌設計畫申請範圍
(依鄉鎮界線標示)

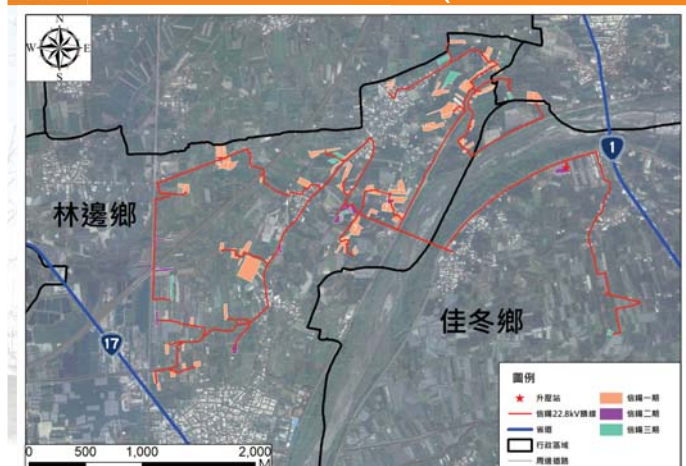

6

01 案件基本資料


籌設計畫申請範圍
(依村里界線標示)

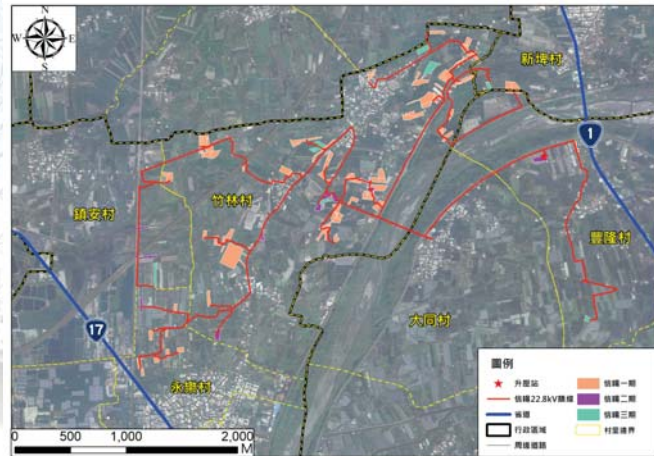

7

01 案件基本資料


工程計畫申請範圍
(依鄉鎮界線標示)

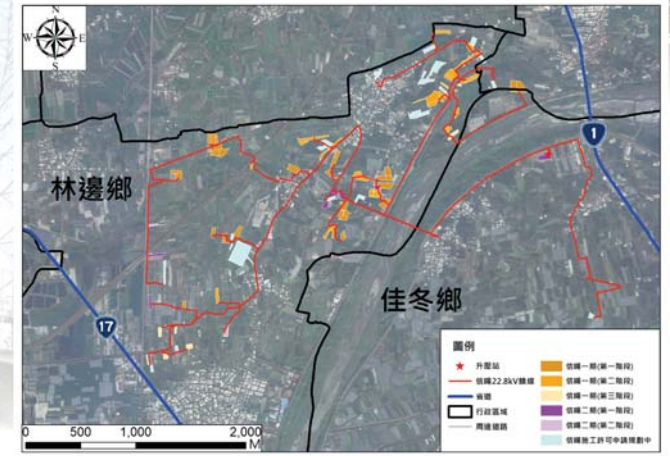

8

01 案件基本資料


工程計畫申請範圍
(依村里界線標示)

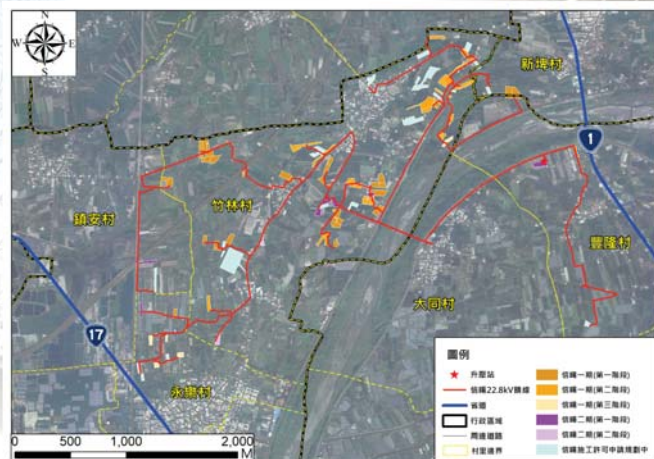

9

01 案件基本資料

永樂村電纜路徑圖

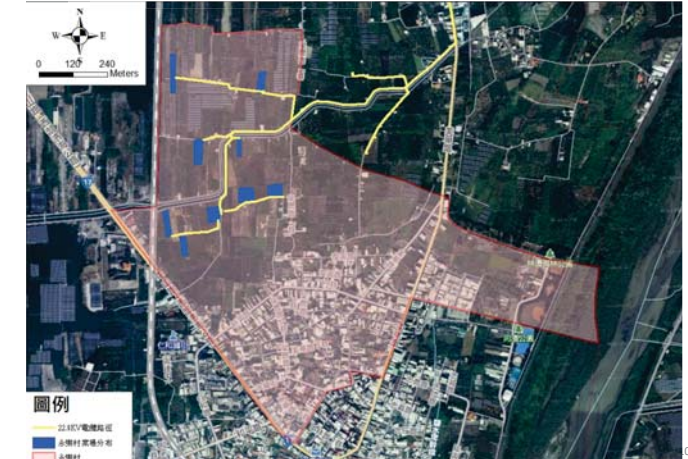

10

02 施工期程

外管線、升壓站及案場施工

115年06月



117年10月

03 工程項目及施工方式

整地、基槽
及結構支架施作



變流器與直交流等
機電設備設置



台電電網引接



太陽能光電板鋪設




高壓電管線埋設

11

12

03 工程項目及施工方式-管線工程

161KV外管線-電力電纜路徑

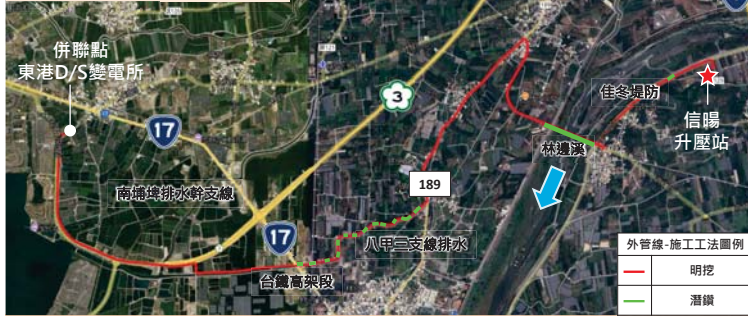

佳冬堤防→林邊溪→中興路→八甲三支線排水→大鵬灣環灣道路


管理單位	路段	管理單位	路段
林邊鄉公所	鄉道	屏東縣政府	佳冬堤防、林邊溪 189縣道、八甲三排水 南埔埤排水
台鐵	台鐵高架段	大鵬灣管理處	大鵬灣環灣道路

信賜161KV外管線路徑行經如上，以明挖、潛鑽工法搭配施工，並依規定向各維管單位辦理路證申請相關作業。


13

03 工程項目及施工方式-管線工程

交管方案-佳冬堤防



現況：
雙向各1車道。



施工中：
保留1車道雙
向通行，工區
兩端設交管人
員。




--- 預計施工範圍
↔ 替代道路


14

03 工程項目及施工方式-管線工程

交管方案-中興路



現況：
雙向各1車道。



施工中：
保留1車道雙
向通行，工區
兩端設交管人
員。




--- 預計施工範圍
↔ 替代道路

15

03 工程項目及施工方式-管線工程

交管方案-西濱沿海公路(台17)



現況：雙向各2車道。



施工中：
保留1車道通行，工區兩端設交管人員，
避開交通尖峰時刻。

16

04 保障公共通行或具替代措施

管線施工前：

- ◆拜訪村長並告知
- ◆張貼公告施工訊息
- ◆申請挖路許可

管線施工中：

- ◆避開交通尖峰期間，避免交通壅塞。
- ◆設置警示標誌、護欄、交通錐及夜間警示燈等。
- ◆聘用當地熟悉路況之指揮人員，協助指引替代道路，維護用路人安全。

管線施工完：

- ◆恢復道路平整



17

05 緊急通報專線及聯絡人



18

06 升壓站設置說明

基地位置：

住冬鄉豐隆村武丁段 25-6、21-10 地號
屬信陽第二期(第一階段)施工許可案件
距本會議地點約 3.86 公里。

設計原則

符合「台電輸電系統規劃準則」、「用戶用電設備裝置規則」及台電相關規則
滿足建築法、防火法等相關法令。

電磁波無影響：

能源署、環保署：太陽光電的電磁波屬於低頻電磁波，且非游離輻射，不會破壞生物細胞分子，不會有溫度變化，不會在人體或生物產生累積效應。

※台南北門實測

於升壓站旁測得電磁波為 0.1 毫高斯遠遠小於我國電磁波規範 833 毫高斯之標準!!
資料來源：屏東縣政府綠能專案推動辦公室



19

07 施工期間環保對策



選擇低噪音機具
或施工工法



施工期間噪音監測



減少機具
高速運轉或空轉



避免夜間施工



機具、車輛停放位
置遠離住宅



避免車輛頻繁進出、
禁鳴喇叭

20

07 施工期間環保對策

避免揚塵

- ◆加強路面灑水，避免風吹或車輛進出造成揚塵，影響空氣品質。



21

07 施工期間環保對策

廢棄物處理

- ◆施工期間產生之廢棄物
設置緊密式儲存容器收集
- ◆委託合格之清除處理機構或
協調地方清潔隊清運至廢棄
物處理廠處理
- ◆工程廢料加以覆蓋後運送



22

08 運轉階段

零污染無毒害



運轉發電時
燃料

太陽



噪音

無



反光

很低

抗反射層設計



排熱

無



水污染

無

均以清水清洗



光電板
電磁波

無



廢棄物

無



變流器
電磁波

很低


符合國際電磁標準

23

08 運轉階段

不產生眩光 不影響居民生活

採用之太陽能面板，具有良好的抗反射玻璃，
可**有效降低太陽光反射所造成之眩光**，
並同時增加透射光所能產生之電能。
為接受最大的陽光照射，本案太陽能模組**傾斜
角度設計為 7°**，在隔離綠帶以及圍籬緩衝後，
無眩光問題，行人與車輛均不受影響，亦不影
響鳥類。



24

08 運轉階段

不影響農漁業經營及發展

- ✓ 不會自行溶解或滲出液體造成汙染
- ✓ 皆無使用化學藥劑清洗
- ✓ 國內外無汙染水質案例
- ✓ 不會產生廢氣、廢水及輻射

能源署澄清-太陽光電無毒害，
綠能環境融合共創多贏



25

08 運轉階段

帶動當地就業機會

JOB 施工前於鄉公所張貼徵才訊息，施工期間將帶動當地就業機會

營運期間



清洗、除草...等-一年2-4次



專業技術(電機、土木基樁檢測)-一年1-2次



安全作業 - 優先聘請在地專業隊協助

26

08 運轉階段

實質成果與效益

56 MW 太陽能規模



國土計畫：減少農漁業用水，涵養土地至少20年



產電效益：電量每年為 **7,600萬度**



工作機會：人力預估約 **30人** 以上



賦育土地新生命 開創綠色新能量

可供約 **2萬戶** 20年用電(屏東縣全縣 29 萬5100戶)


27

09 回收階段

廢棄太陽能板回收

◆使用完畢的太陽能板回收採一般廢棄物處理途徑，回收前案場所有者應至環保署「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」進行排出登記。

◆依「再生能源發電設備設置管理辦法」光電業者在申請設置或汰換太陽能板時預繳**每坪1000元**的回收處理費，由政府交給經過認證的專業回收業者處理。

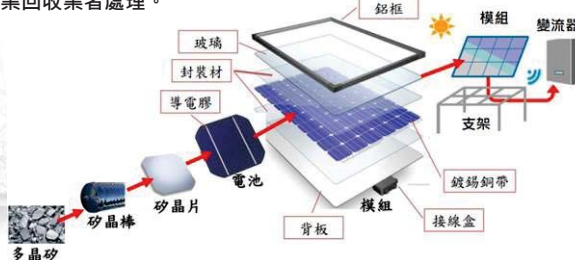

28

Q&A 意見交流

永續低調
綠色內涵
留居屏東
自在生活



謝謝您的聆聽
THANK YOU!

信陽綠電股份有限公司太陽能光電場 建置太陽能光電發電設施之地方說明會 會議照片

場地布置



里民報到



里民報到



里民報到



公司報告



公司報告



里民參與情況



里民參與情況



里民參與情況



里民參與情況

